

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ  
সচিব এর দপ্তর

তারিখ: ২৮/০২/২৪

অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)  
অতিরিক্ত সচিব (শিক্ষা)  
অতিরিক্ত সচিব (জনসংযোগ, প.ক. ও আইন)  
অতিরিক্ত সচিব (আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট)  
অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)  
অতিরিক্ত সচিব (বায়োটেকনোলজি)  
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন অধিশাখা)  
অতিরিক্ত সচিব (যুগ্ম)  
অতিরিক্ত সচিব (শিক্ষা)  
অতিরিক্ত সচিব (পরিচালনা)  
অতিরিক্ত সচিব

সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ  
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়  
(মেরামত অধিশাখা)  
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

স্মারক- ৫৯.০০.০০০০.১৩০.৯৯.০০৭.২০২০-২৪

তারিখঃ ৯ ফাল্গুন ১৪৩০  
২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

**বিষয়:** ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ওপির আওতায় নির্মিত সুনামগঞ্জ জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয় এবং তাহিরপুর ও বিশ্বম্ভরপুর উপজেলাধীন ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে মহোদয়ের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, 4th HPNSP শীর্ষক ওপি (Operational Plan) এর আওতায় স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২৩-২৪ অর্থবছরে নির্মিতব্য জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, সুনামগঞ্জ এবং তাহিরপুর উপজেলাধীন বালিজুরি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ও বিশ্বম্ভরপুর উপজেলাধীন বাদাঘাট মডেল ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র দুটি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এ সাথে সংযুক্ত করে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: ১২ পাতা

২২/০২/২৪  
মোহাম্মদ মফিজুল ইসলাম  
উপসচিব

সচিব

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ।

স্মারক- ৫৯.০০.০০০০.১৩০.৯৯.০০৭.২০২০-২৪ (১/৪)

তারিখঃ ৯ ফাল্গুন ১৪৩০  
২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো :

- ১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন অনুবিভাগ) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।)
- ৩। যুগ্মসচিব (নির্মাণ ও মেরামত অধিশাখা) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (যুগ্মসচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।)
- ৪। অফিস কপি।

মোহাম্মদ মফিজুল ইসলাম  
উপসচিব

A/O  
২৯/০২/২৪

৩৯  
২৯/০২/২৪  
৫৯.০০.০০০০.১৩০.৯৯.০০৭.২০২০-২৪

২৬৫

সুনামগঞ্জ জেলাধীন সদর ও বিশ্বম্ভরপুর উপজেলাধীন ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, নির্মাণাধীন সুনামগঞ্জ জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয় ভবন পরিদর্শন প্রতিবেদন।

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম: মোহাম্মদ মফিজুল ইসলাম

উপসচিব

পরিদর্শনের তারিখ : ০৩/১২/২০২৩ খ্রি.

পরিদর্শন প্রতিবেদন

সুনামগঞ্জ জেলাধীন বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার বাদাঘাট ও তাহেরপুর উপজেলার বালিজুরি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, নির্মাণাধীন জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয় ভবন সরেজমিনে পরিদর্শনকালে জেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা বিকাশ কুমার দাশ, ডা: ননীভূষণ তালুকদার, এডিসিসি সুনামগঞ্জ উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, বিশ্বম্ভরপুর, বাদাঘাট (দ:) মডেল ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ এর কর্মকর্তা, বালিজুরি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা হাচনারা খাতুন এবং HED-এর সহকারী প্রকৌশলী প্রদীপ কুমার শীল উপস্থিত ছিলেন।

**১) বাদাঘাট (দ:) মডেল ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ**

বাদাঘাট (দঃ) মডেল ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রটি ১৯৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। সারা বাংলাদেশে ১৮ অক্টোবর প্রথম ৫০০ টি হাসপাতালের সাথে কেন্দ্র টি ২০২২ সালে মডেল ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কেন্দ্র হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। জেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা বিকাশ কুমার দাশ জানান, কেন্দ্রটিতে চলতি অর্থবছরে ইতোমধ্যে ১৩৫ টি ডেলিভারি হয়েছে। গত বছর জনসংখ্যা দিবসে জেলার একটি শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানসহ ৩ টি ক্যাটাগরিতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে।

**সমস্যা:**

- ১) কেন্দ্রটি মেরামত ও সংস্কার আবশ্যিক
- ২) SACMO এবং নিরাপত্তা প্রহরী জরুরিভিত্তিতে পদায়ন প্রয়োজন
- ৩) কেন্দ্রের আঙ্গিনায় আরো মাটি ভরাট জরুরি
- ৪) সীমানা প্রাচীর উঁচুকরণ আবশ্যিক
- ৫) ভবনের ছাদ মেরামত ও রংকরণ জরুরি

**মন্তব্য:**

- ১) SACMO উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসারসহ অন্যান্য শূন্যপদে জরুরিভিত্তিতে পদায়ন প্রয়োজন।
- ২) কেন্দ্রের আঙ্গিনায় আরো মাটি ভরাট, সীমানা প্রাচীর উঁচুকরণ ও ভবনের ছাদ মেরামত ও রংকরণ করা প্রয়োজন।
- ৩) সংশ্লিষ্ট প্রকৌশল সংস্থার প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে মেরামত ও সংস্কারের বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

**২) বালিজুরি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র**

বালিজুরি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ১৯৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি মূল সড়ক থেকে নিচু জায়গায় থাকায় বর্ষাকালে এটিতে জলাবদ্ধতা থাকে। এর ফলে বছরের অর্ধেক সময় কাজ করার অনুপযোগী থাকে। জেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা বিকাশ কুমার দাশ জানান, গত বন্যায় বিল্ডিং এর দেয়াল এবং আসবাবপত্রের অনেক বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়। মূল ফটক ডেঙে গিয়ে উক্ত কেন্দ্রের অনেক আসবাবপত্র, অটোক্রেন্ড ম্যাশিন, অক্সিজেন সিলিন্ডারসহ অনেক সরঞ্জাম চুরি হয়ে যায়। লেবার ও ওটি রুম কাজের সম্পূর্ণ অনুপযোগি হওয়ায় কিশোর-কিশোরী কন্যারে কোন রকমে সেবা কার্যক্রম চলছে। পানি সরবরাহ ব্যবস্থা ও কেন্দ্রের অবকাঠামোগত সমস্যার কারণে উক্ত এলাকায় বিপুল সংখ্যক সেবা গ্রহীতা থাকা সত্ত্বেও এখানে সেবার জন্য আসতে আগ্রহী হয় না। তাছাড়া, এখানে শুধু ১জন এফডব্লিউডি কর্মরত আছেন। অন্য সকল পদ শূন্য।

**মন্তব্য:**

- ১) SACMO উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসারসহ অন্যান্য শূন্যপদে জরুরিভিত্তিতে পদায়ন প্রয়োজন।
- ২) অবকাঠামোগত মেরামত ও সংস্কার প্রয়োজন।
- ৩) বর্ষাকাললে জলাবদ্ধতা নিরসনে কেন্দ্রের আঙ্গিনায় আরো মাটি ভরাট করে
- ৪) পানি সরবরাহ ব্যবস্থা ও কেন্দ্রের অবকাঠামোগত সমস্যা সমাধান করা হলে সেবা গ্রহীতার সংখ্যা বৃদ্ধিসহ সেবার মান বৃদ্ধি পাবে।
- ৫) সংশ্লিষ্ট প্রকৌশল সংস্থার প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে মেরামত ও সংস্কারের বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

→

3) Name of works: Construction of the Deputy Director office, Family Planning, Sunamganj

Description of Works: Site Development, Civil, Sanitary, Electrical works, Construction of Internal road, Internal drain and Apron, Boundary wall, Sinking of Deep Tubewell etc.

#### Short visit report

1. Date of work order: 16/01/2023

2. Date of starting work: 05/03/2023

3) Tender ID no: 747766

3. Total allocation: 6.07 crore

4. Financial progress: 35%

5. Physical progress: 40%

#### 6. Substructure work (Foundation)

a. Precast pile 131 numbers were driven

b. Test pile: 1 no

c. Pile length: 65 feet, rectangular pile size: 350mm × 350 mm

d. Pile cap size: 8 feet × 8 feet

7. Concrete mix design: Cement: sand: stone proportion = 1:1.5: 3 (rich concrete)

8. Foundation footing, grade beam and first floor column casting works have already been completed.

Comments: Progress of work is satisfactory. All works are expected to be completed within 30/06/3/2023


Note: In the Annual Report, HED part Progress of construction of DD Family Planning Office, Sunamganj has shown only 4% which should be revised.

→  
28/02/23

মোহাম্মদ মফিজুল ইসলাম  
উপসচিব (মেরামত শাখা)  
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ


590

ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੋਕਸ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਿੰਦੂ 'ਕਮਰੇ' ਦੇ

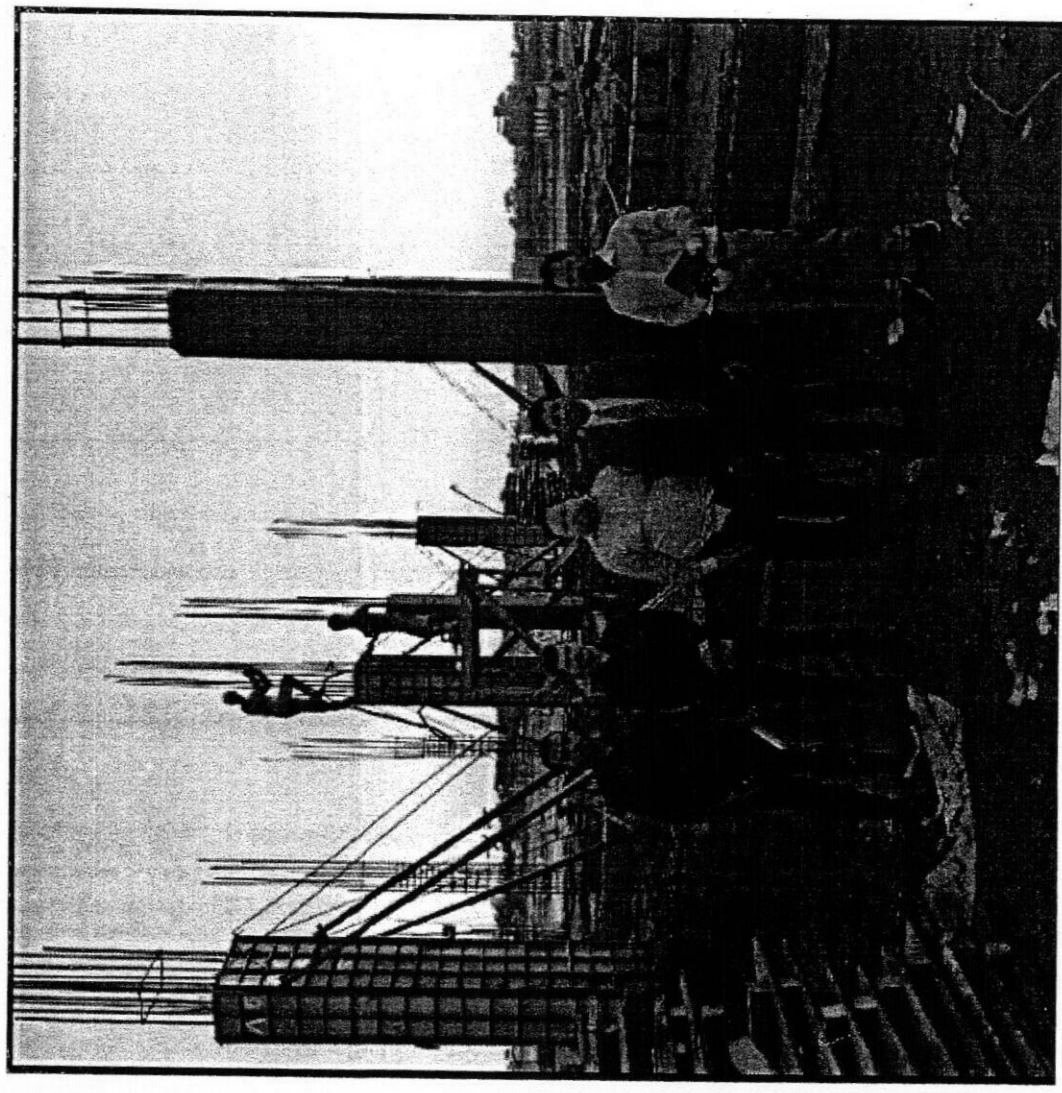



ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ

-362-

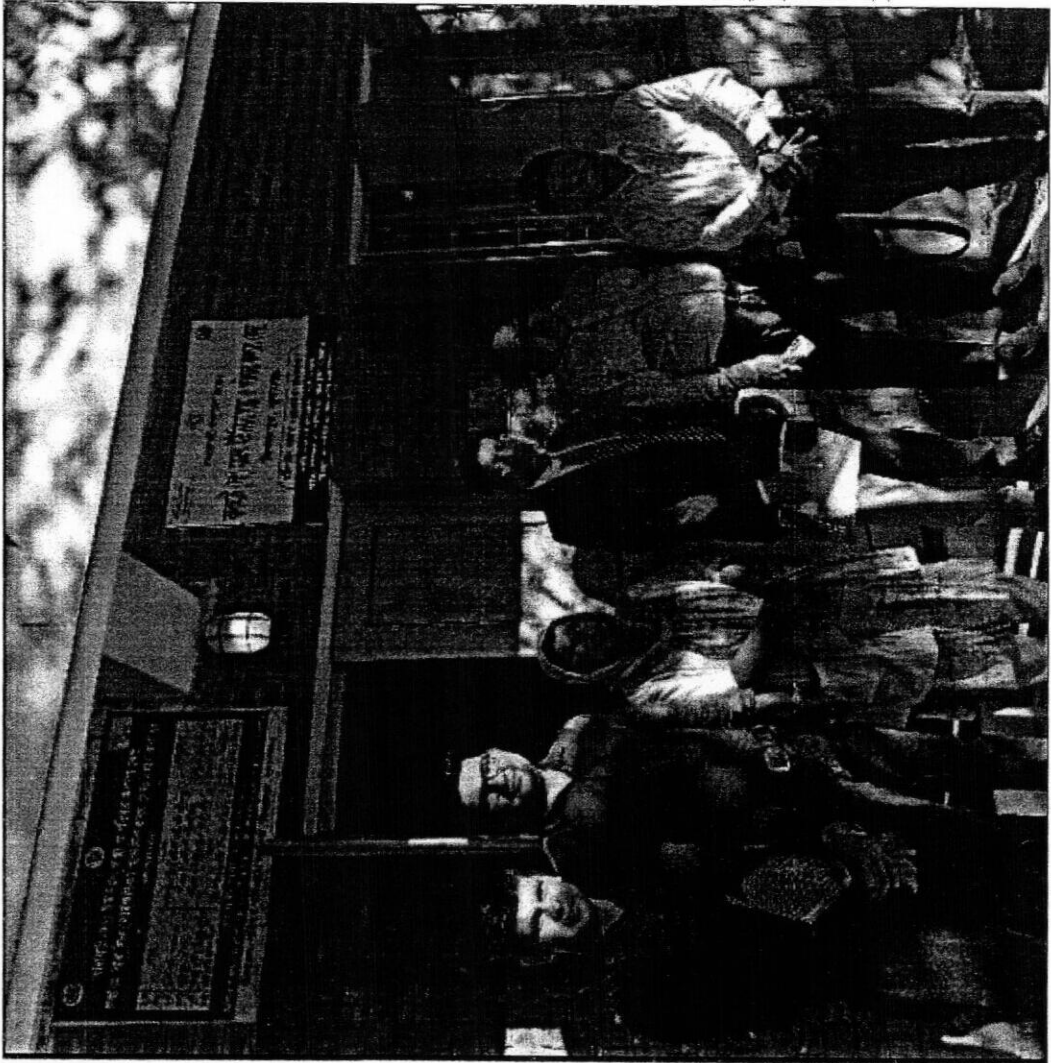


2008

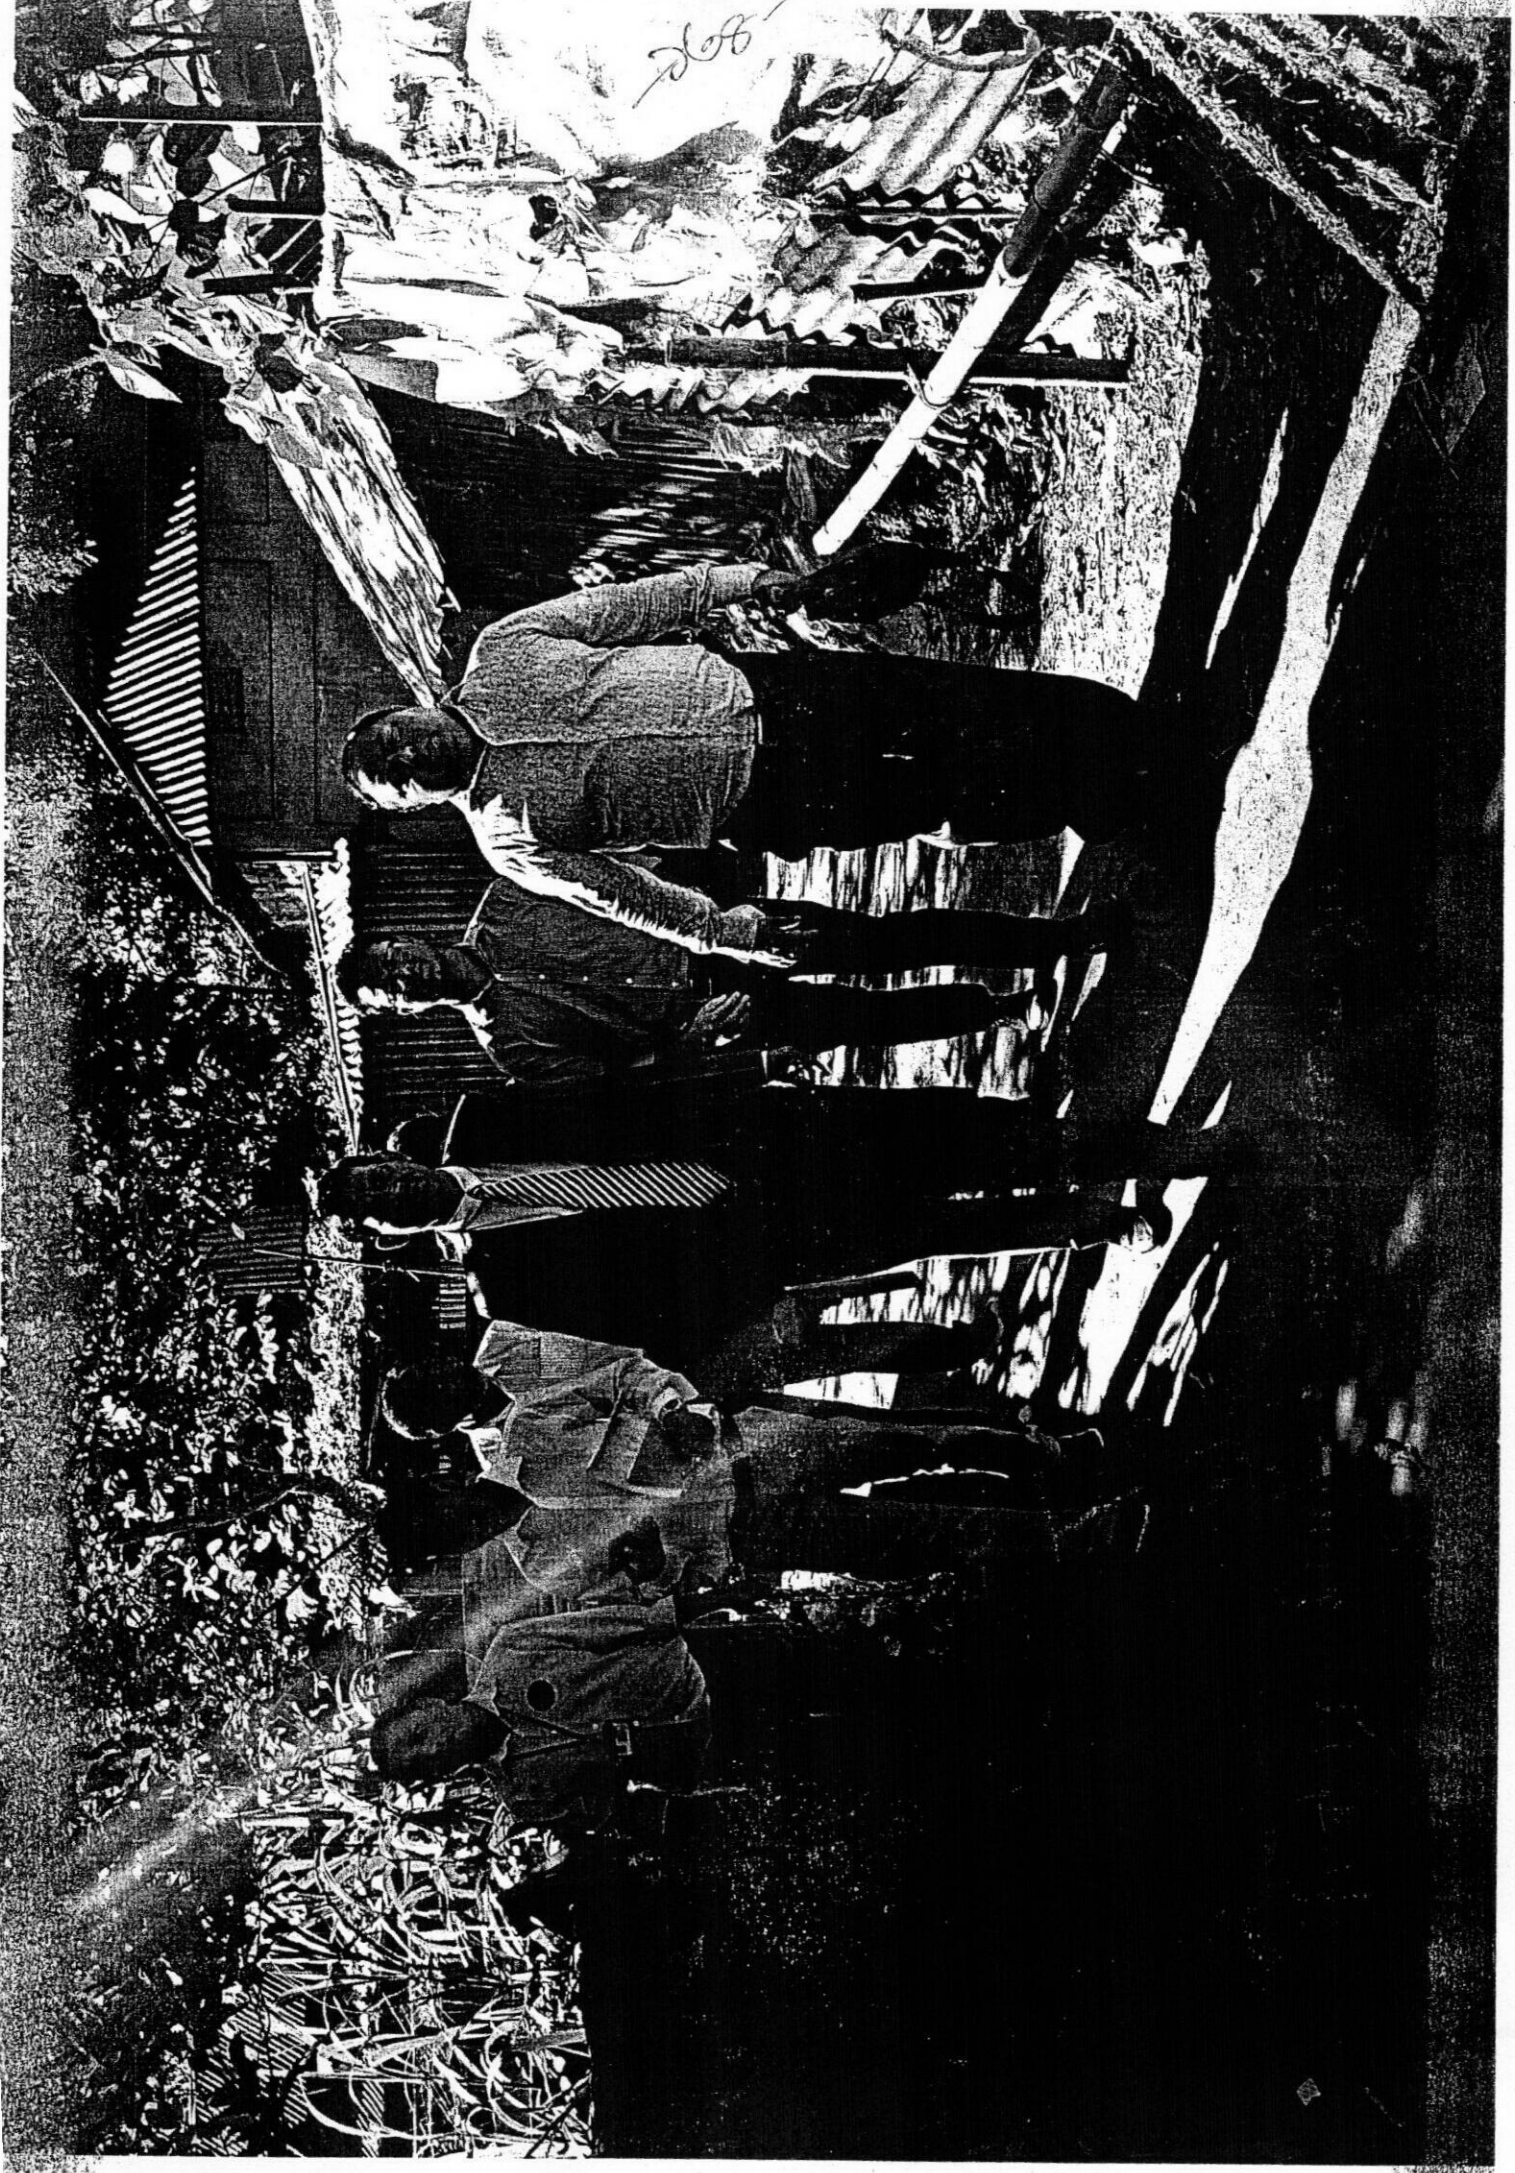

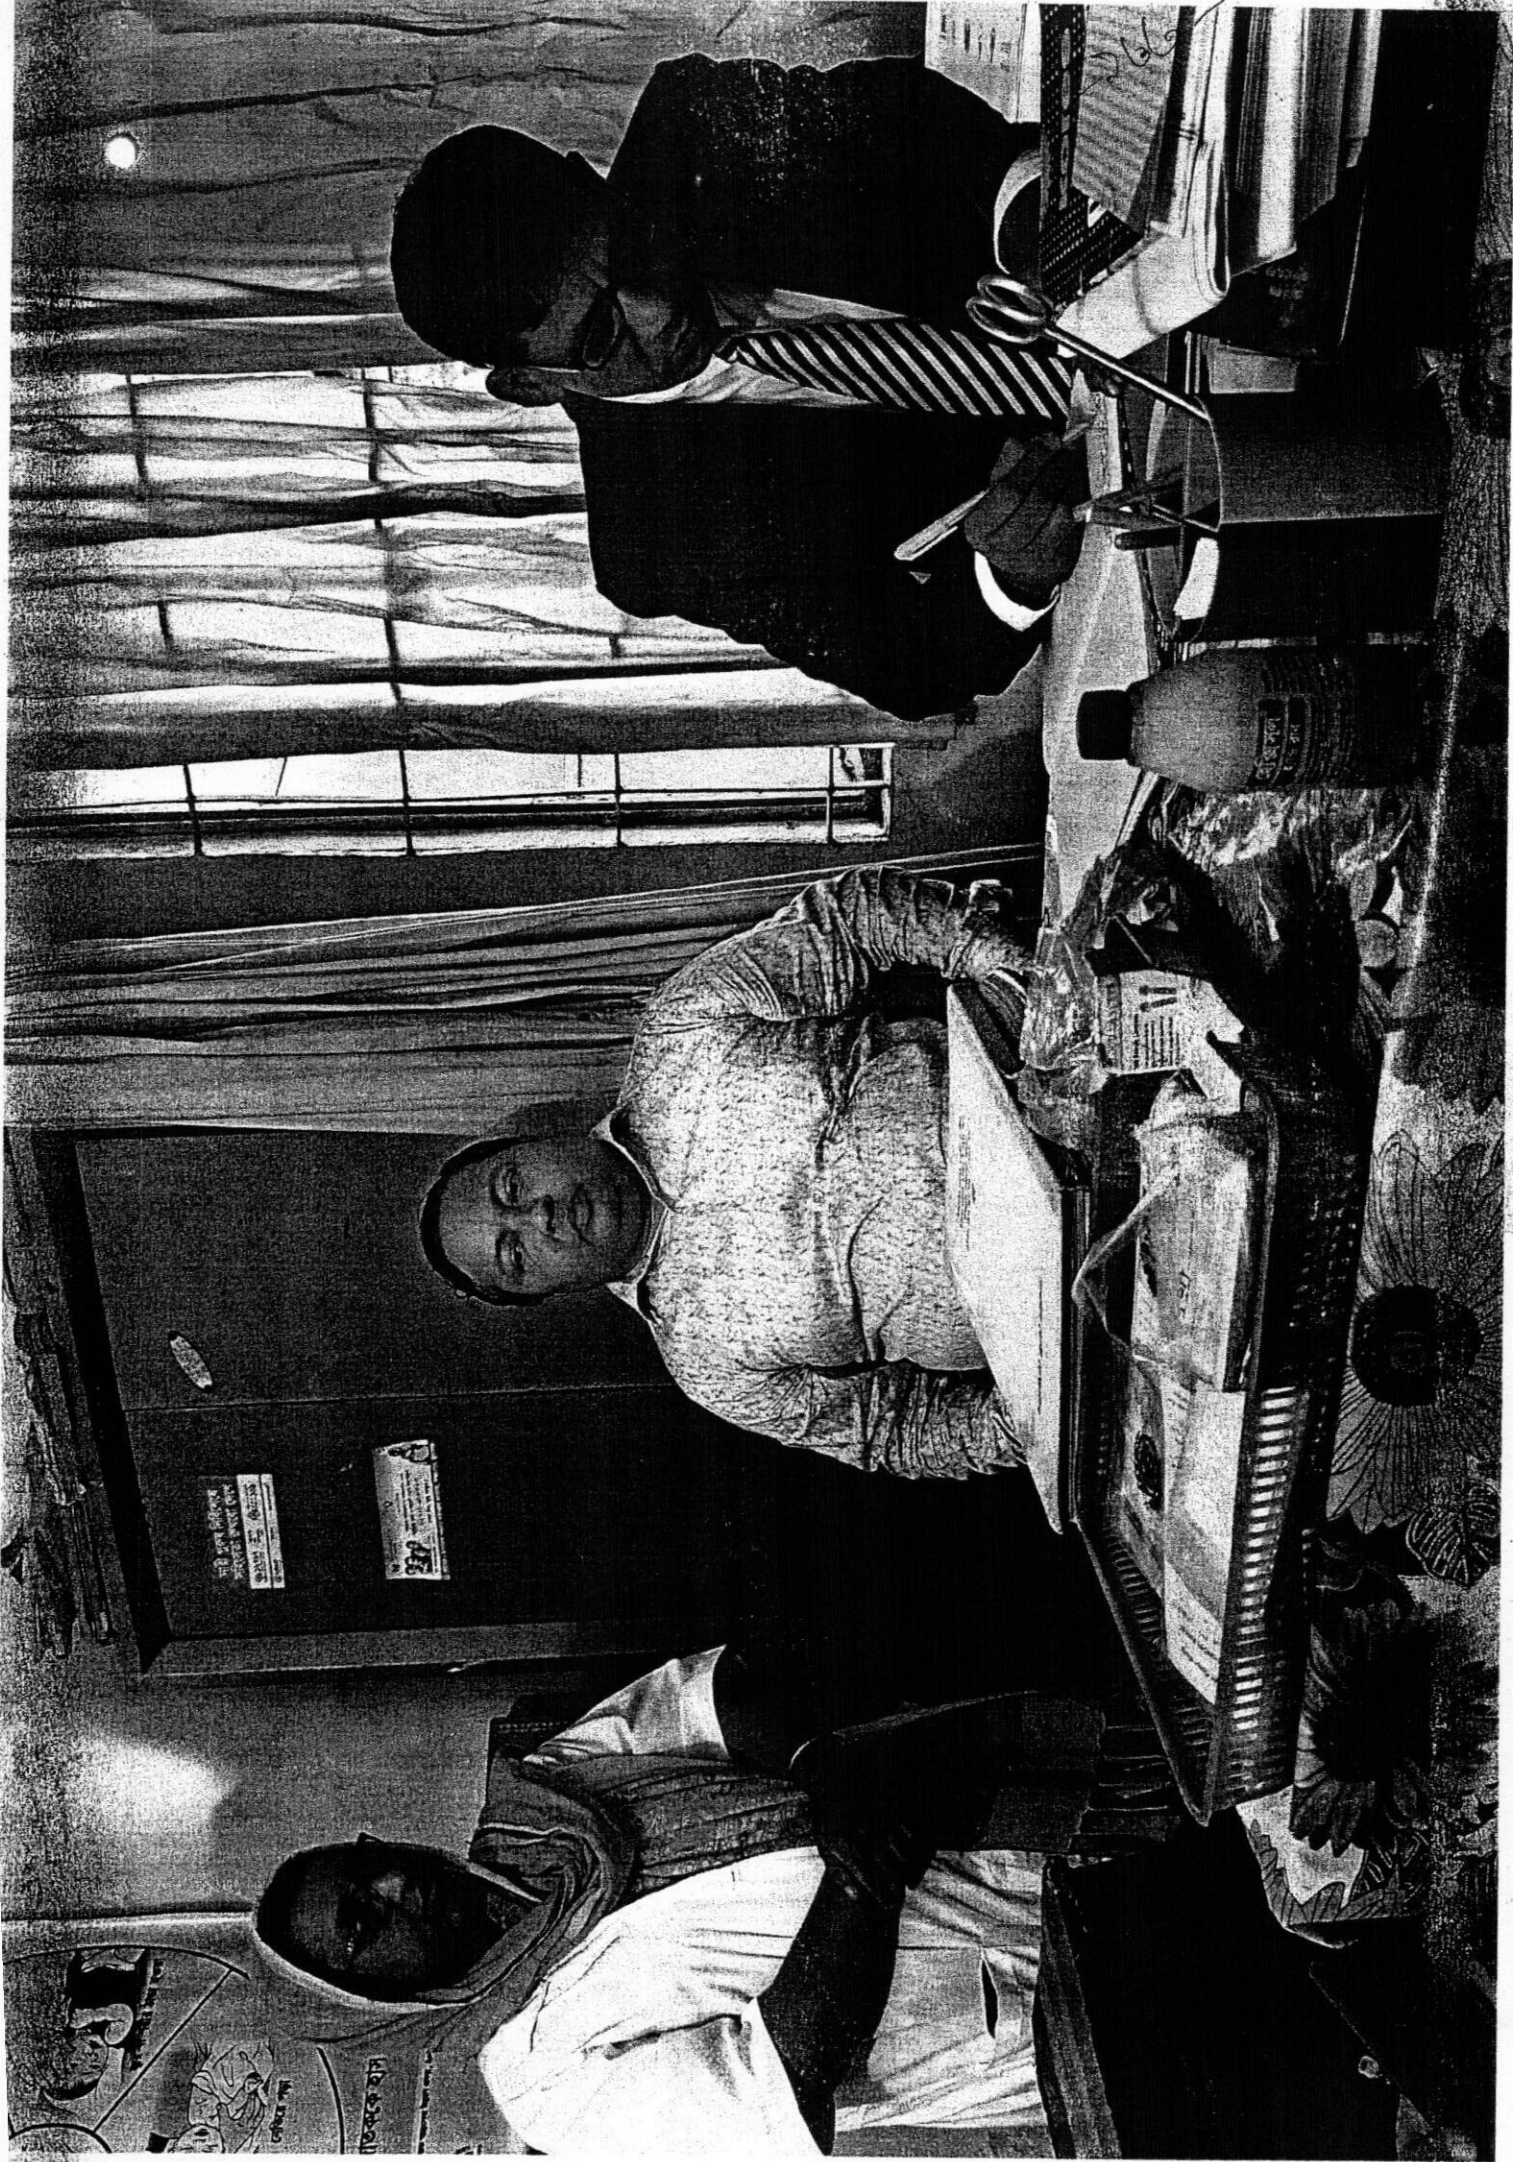

-262-

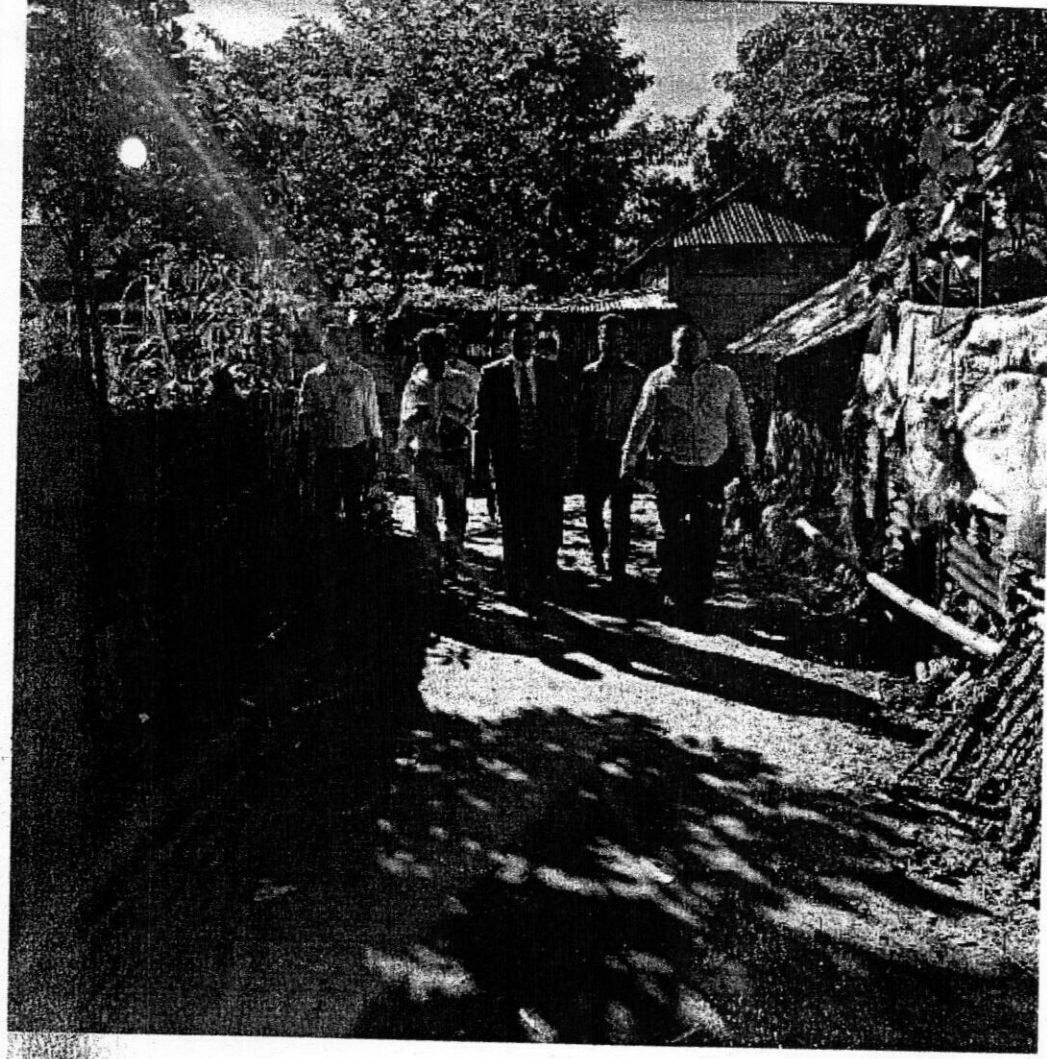




১৬৩



✓ 260-

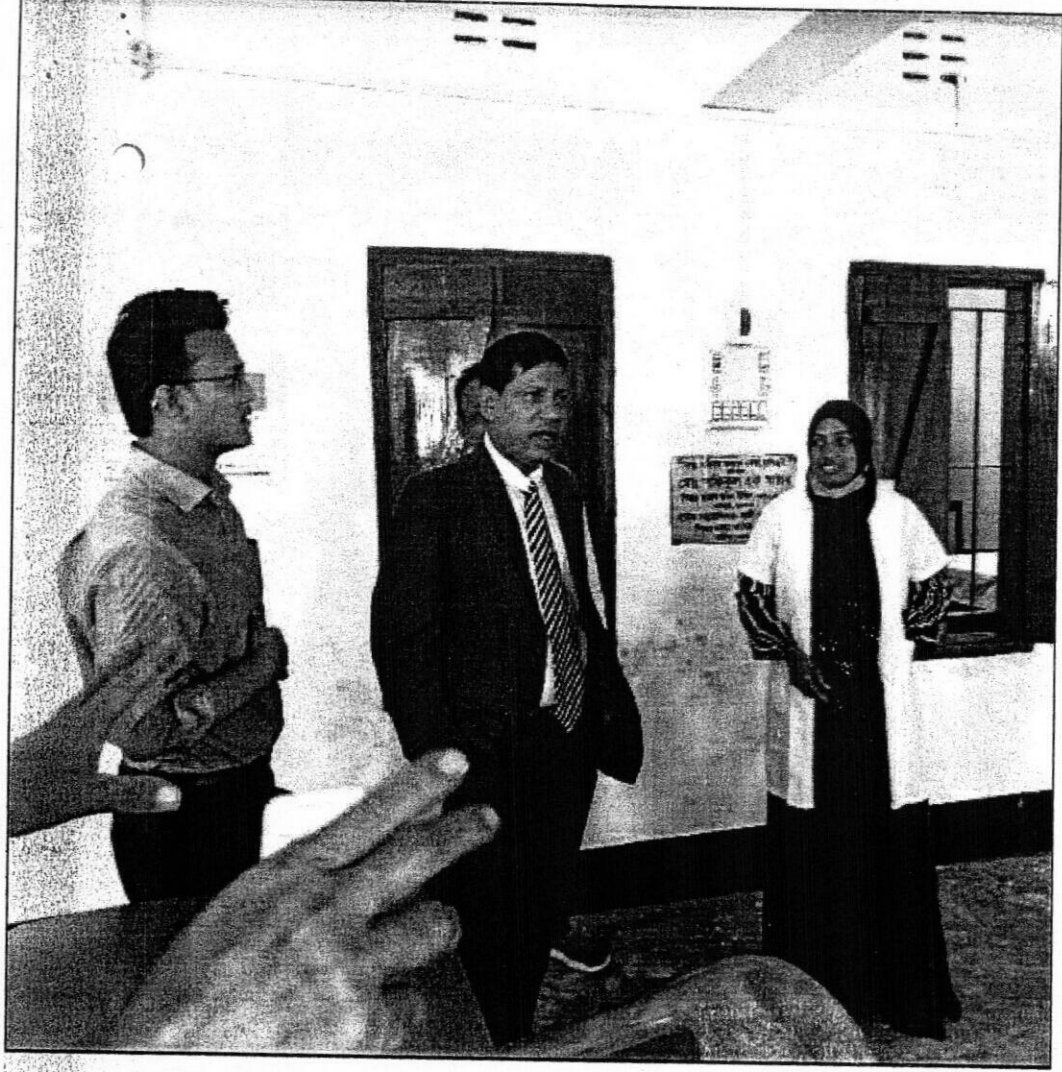

222



5215



329



326

