

২০৪ ২৫/২/২৪

৩



২০৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
পারসোনেল-১ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.mefwd.gov.bd

[Handwritten signature]

মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, জেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস এবং বঙ্গবন্ধু মেডিকেল কলেজ, সুনামগঞ্জ এর OP এর আওতায় প্রাপ্ত বরাদ্দের
অগ্রগতি প্রতিবেদন

মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, জেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস এবং বঙ্গবন্ধু মেডিকেল কলেজ, সুনামগঞ্জ এর OP এর আওতায় প্রাপ্ত বরাদ্দের
অগ্রগতি প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট ছবি সহ নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

ক্রম	পরিদর্শন প্রতিষ্ঠান	প্রতিবেদন	সংযুক্ত ছবি	সুপারিশ																																																																											
০১.	মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, সুনামগঞ্জ	মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র রিকনস্ট্রাকশন কাজ, জেলা সুনামগঞ্জ - কাজের অগ্রগতি ২৫%। এখন গ্রেড বিম এর কাজ চলমান। ৮ তলা ফাউন্ডেশন এর উপর ৮ তলা ভবন হবে। কাস্ট ইন সিটু পাইল, পাইল ক্যাপ, প্যাডেস্টাল কলাম, লিফট কোর, সেপটিক ট্যাংক এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। Work order Amount ১৪.৮৮ কোটি টাকা																																																																													
০২.	জেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস, সুনামগঞ্জ	জেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস ভবন কনস্ট্রাকশন কাজ, সুনামগঞ্জ - কাজের অগ্রগতি ৬১%। এখন গাথুনির কাজ এবং সীমানা প্রাচীর কনস্ট্রাকশন কাজ চলমান রয়েছে। ৬ তলা ফাউন্ডেশন এর উপর ৩ তলা ভবন হবে। সকল ছাদ ঢালাই/স্ট্রীকচারাল কাজ সম্পন্ন হয়েছে। পিএল স্ল্যাব, গ্রাউন্ড ফ্লোর স্ল্যাব, ফার্স্ট ফ্লোর স্ল্যাব, সেকেন্ড ফ্লোর স্ল্যাব মোট ০৪ টি ছাদ ঢালাই হয়েছে। Work order Amount ৬.০৭ কোটি। আশা করছি কাজটি জুন ২৪ এর মাঝে শেষ হবে। জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ের ২০২৩-২০২৪ আর্থিক সালের উন্নয়ন খাতের খরচ বিবরণী নিম্নরূপঃ																																																																													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>ঘর</th> <th>স্মারক</th> <th>তারিখ</th> <th>টাকার পরিমাণ</th> <th>মন্তব্য</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>এমসিইচএস</td> <td>২২০</td> <td>০২/০৭/২০২৩</td> <td>১৬৭৬২০০</td> <td>MCWC ৪টি</td> </tr> <tr> <td>এমসিইচএস</td> <td>২৮</td> <td>২৪/০২/২০২৪</td> <td>১৭২৭০০০</td> <td>MCWC ৪টি</td> </tr> <tr> <td>FSD</td> <td>৪২৮</td> <td>২৭/০২/২০২৩</td> <td>১০২০৪০০</td> <td>উপজেলা ১১টি</td> </tr> <tr> <td>FSD</td> <td>৬৪২</td> <td>২৭/০২/২০২৩</td> <td>৪৩১৭০০</td> <td>উপজেলা ১১টি</td> </tr> <tr> <td>IEM</td> <td>২৮৮২</td> <td>০৭/১১/২০২৩</td> <td>১৬৬০০০</td> <td>সেবা ও প্রচার জেলা ও ১১ উপজেলা</td> </tr> <tr> <td>MIS</td> <td>৩২৩</td> <td>১১/০২/২০২৩</td> <td>৪৭৬৬০০</td> <td>ই-গভর্নেন্স বিল ১২ উপজেলা</td> </tr> <tr> <td>CCSDP</td> <td>২৬৯</td> <td>২৭/০২/২০২৩</td> <td>২৪০০০০</td> <td>ইমপ্রুভ মাদ্রাস</td> </tr> <tr> <td>FSD</td> <td>৪২৭/৪৬৩</td> <td>১২/০২/২০২৩</td> <td>৩৯১০৪০০</td> <td>সেখাদেবীর বেডরম দিরাই, তাহিরপুর, শাহদিগড় ওয়াইআই বিল সকল অফিস</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>৮৬৪০০</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CCSDP</td> <td>২৮৮</td> <td>০৪/০৩/২০২৩</td> <td>১০৪৮-০০০০</td> <td>সেখাদেবীর বেডরম নোয়ারাবাদার, ধর্মশা, জলধা/বুধু, হাতক</td> </tr> <tr> <td>উন্নয়ন ও সরবরাহ</td> <td>১০৪৬</td> <td></td> <td>৬৬৯৬০০</td> <td>আনন্দপুরের বেডরম ড্রেশার মডেল</td> </tr> <tr> <td>IEM.HPNSP</td> <td>১১০ ২১৭ ১০৯ ১১০ ১ ৭</td> <td>০৪/০২/২০২৩ ১৪/০২/২০২৩ ১০/০২/২০২৩ ১৪/০২/২০২৩ ১৪/০২/২০২৩ ১৪/০২/২০২৩</td> <td>৩৭৪৭০০</td> <td>এটি ড্যান জেলা</td> </tr> <tr> <td>CCSDP</td> <td>৩১৪</td> <td>১৭/০২/২০২৩</td> <td>২৭১০০০</td> <td>FPCSQIT জেলা অফিস</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>২৪২৪২৮০০</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ঘর	স্মারক	তারিখ	টাকার পরিমাণ	মন্তব্য	এমসিইচএস	২২০	০২/০৭/২০২৩	১৬৭৬২০০	MCWC ৪টি	এমসিইচএস	২৮	২৪/০২/২০২৪	১৭২৭০০০	MCWC ৪টি	FSD	৪২৮	২৭/০২/২০২৩	১০২০৪০০	উপজেলা ১১টি	FSD	৬৪২	২৭/০২/২০২৩	৪৩১৭০০	উপজেলা ১১টি	IEM	২৮৮২	০৭/১১/২০২৩	১৬৬০০০	সেবা ও প্রচার জেলা ও ১১ উপজেলা	MIS	৩২৩	১১/০২/২০২৩	৪৭৬৬০০	ই-গভর্নেন্স বিল ১২ উপজেলা	CCSDP	২৬৯	২৭/০২/২০২৩	২৪০০০০	ইমপ্রুভ মাদ্রাস	FSD	৪২৭/৪৬৩	১২/০২/২০২৩	৩৯১০৪০০	সেখাদেবীর বেডরম দিরাই, তাহিরপুর, শাহদিগড় ওয়াইআই বিল সকল অফিস				৮৬৪০০		CCSDP	২৮৮	০৪/০৩/২০২৩	১০৪৮-০০০০	সেখাদেবীর বেডরম নোয়ারাবাদার, ধর্মশা, জলধা/বুধু, হাতক	উন্নয়ন ও সরবরাহ	১০৪৬		৬৬৯৬০০	আনন্দপুরের বেডরম ড্রেশার মডেল	IEM.HPNSP	১১০ ২১৭ ১০৯ ১১০ ১ ৭	০৪/০২/২০২৩ ১৪/০২/২০২৩ ১০/০২/২০২৩ ১৪/০২/২০২৩ ১৪/০২/২০২৩ ১৪/০২/২০২৩	৩৭৪৭০০	এটি ড্যান জেলা	CCSDP	৩১৪	১৭/০২/২০২৩	২৭১০০০	FPCSQIT জেলা অফিস				২৪২৪২৮০০			
ঘর	স্মারক	তারিখ	টাকার পরিমাণ	মন্তব্য																																																																											
এমসিইচএস	২২০	০২/০৭/২০২৩	১৬৭৬২০০	MCWC ৪টি																																																																											
এমসিইচএস	২৮	২৪/০২/২০২৪	১৭২৭০০০	MCWC ৪টি																																																																											
FSD	৪২৮	২৭/০২/২০২৩	১০২০৪০০	উপজেলা ১১টি																																																																											
FSD	৬৪২	২৭/০২/২০২৩	৪৩১৭০০	উপজেলা ১১টি																																																																											
IEM	২৮৮২	০৭/১১/২০২৩	১৬৬০০০	সেবা ও প্রচার জেলা ও ১১ উপজেলা																																																																											
MIS	৩২৩	১১/০২/২০২৩	৪৭৬৬০০	ই-গভর্নেন্স বিল ১২ উপজেলা																																																																											
CCSDP	২৬৯	২৭/০২/২০২৩	২৪০০০০	ইমপ্রুভ মাদ্রাস																																																																											
FSD	৪২৭/৪৬৩	১২/০২/২০২৩	৩৯১০৪০০	সেখাদেবীর বেডরম দিরাই, তাহিরপুর, শাহদিগড় ওয়াইআই বিল সকল অফিস																																																																											
			৮৬৪০০																																																																												
CCSDP	২৮৮	০৪/০৩/২০২৩	১০৪৮-০০০০	সেখাদেবীর বেডরম নোয়ারাবাদার, ধর্মশা, জলধা/বুধু, হাতক																																																																											
উন্নয়ন ও সরবরাহ	১০৪৬		৬৬৯৬০০	আনন্দপুরের বেডরম ড্রেশার মডেল																																																																											
IEM.HPNSP	১১০ ২১৭ ১০৯ ১১০ ১ ৭	০৪/০২/২০২৩ ১৪/০২/২০২৩ ১০/০২/২০২৩ ১৪/০২/২০২৩ ১৪/০২/২০২৩ ১৪/০২/২০২৩	৩৭৪৭০০	এটি ড্যান জেলা																																																																											
CCSDP	৩১৪	১৭/০২/২০২৩	২৭১০০০	FPCSQIT জেলা অফিস																																																																											
			২৪২৪২৮০০																																																																												

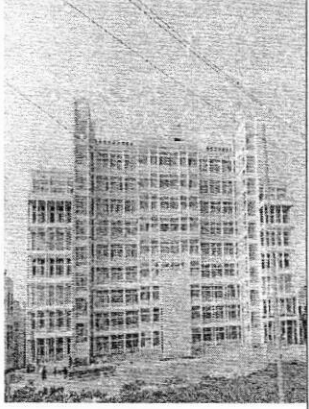
A/O
26/02/24

৪২
২৪/০২/২৪

১৪/০২/২৪

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

206 -

ক্রম	পরিদর্শন প্রতিষ্ঠান	প্রতিবেদন	সংযুক্ত ছবি	সুপারিশ
০৩.	বঙ্গবন্ধু মেডিকেল কলেজ, সুনামগঞ্জ স্থাপন	<p>➤ মেডিকেল কলেজের একাডেমিক ভবন: মোট প্রাপ্ত বরাদ্দ- ৩৭৮৫৮.৮৪ লক্ষ টাকা, ব্যয়- ৪৫১৭.৬৫ লক্ষ টাকা, ভৌত অগ্রগতি- ৯৭% (গ্যালারি সহ ফলস সিলিং এর কাজ চলমান। অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক কাজ সমাপ্ত। লিফট এর কাজ সমাপ্ত, এয়ারকুলার স্থাপন কাজ সমাপ্ত হস্তান্তর প্রক্রিয়াধীন)</p> <p>➤ নার্সিং কলেজের একাডেমিক ভবন: মোট প্রাপ্ত বরাদ্দ- ৩৭৮৫৮.৮৪ লক্ষ টাকা, ব্যয়- ১৩৫৫.০০ লক্ষ টাকা, ভৌত অগ্রগতি- ৬৬% (বাহিরের প্লাস্টারের কাজ সমাপ্ত। ভিতরের ফিনিসিং কাজসহ টাইলস এর কাজ চলছে)</p> <p>➤ ছাত্র হোস্টেল ভবন: মোট প্রাপ্ত বরাদ্দ- ৩৭৮৫৮.৮৪ লক্ষ টাকা, ব্যয়- ৪৭৮১.০০ লক্ষ টাকা, ভৌত অগ্রগতি- ৬২% (বাহিরের প্লাস্টারের কাজ সমাপ্ত। ভিতরের টাইলস এর কাজ চলছে। অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক কাজ চলমান)</p> <p>➤ ছাত্রী হোস্টেল ভবন: মোট প্রাপ্ত বরাদ্দ- ৩৭৮৫৮.৮৪ লক্ষ টাকা, ব্যয়- ৪৭৮১.০০ লক্ষ টাকা, ভৌত অগ্রগতি- ৬৪% (বাহিরের প্লাস্টারের কাজ সমাপ্ত। ভিতরের টাইলস এর কাজ চলছে। অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক কাজ চলমান)</p> <p>➤ প্রিন্সিপাল ও ডিরেক্টরের বাসভবন: মোট প্রাপ্ত বরাদ্দ- ৩৭৮৫৮.৮৪ লক্ষ টাকা, ব্যয়- ৪৭৮১.০০ লক্ষ টাকা, ভৌত অগ্রগতি- ৭৮% (স্যানিটারি ফিটিংস ফিক্সিং, সীড়ির রেলিং, বারান্দার এসএস সহ টাইলস এর কাজ চলছে। অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক কাজ চলমান। ফেসিং ব্রিকস এর কাজ সমাপ্ত)</p>		


দুর-রে-শাহওয়াজ
উপসচিব (পারসোনেল-১)
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
ফোন-৫৫১০০৭৯৫
email-per1@mefwd.gov.bd
